

	Relatório Técnico nº 001/2011	
OBRA:	Complementação da execução das fundações e dos elementos estruturais do Edifício-Sede do TRF/1ª Região.	
LOCAL:	Setor de Administração Federal Sul, Quadra 5, Lote 3, – Brasília – DF.	
CONTRATO:	Contrato nº 098/2010/TRF1	
CONTRATANTE:	Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).	
CONTRATADA:	Engefort Construtora Ltda.	
RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR FASE		

1. INTRODUÇÃO

1.1 Trata-se da avaliação da complementação da execução das fundações e dos elementos estruturais do Edifício-Sede do TRF/1ª Região.

1.2 23 Dez 10: celebrou-se o Termo de Contrato nº 098/2010, entre a ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA e o TRF/1, cujo objeto é execução da complementação das fundações e dos elementos estruturais da Nova Sede daquele órgão.

Valor contratual: **R\$ 89.849.151,14**. Prazo de execução: **20 meses**.

1.3 10 Jan 11: emitiu-se a ordem de serviço da referida obra, com prazo de execução de 20 meses corridos a partir desta data.

1.4 22 Fev 10: realizou-se pela TRF/1ª, conforme RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO, período de execução de 15/01/2011 a 14/02/2011, a 1ª Medição da obra no valor de R\$ 350.911,52.

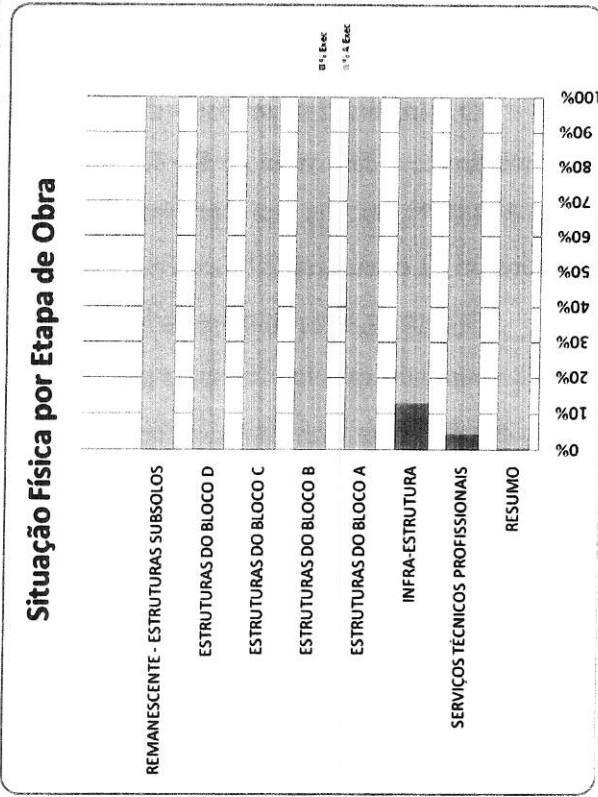
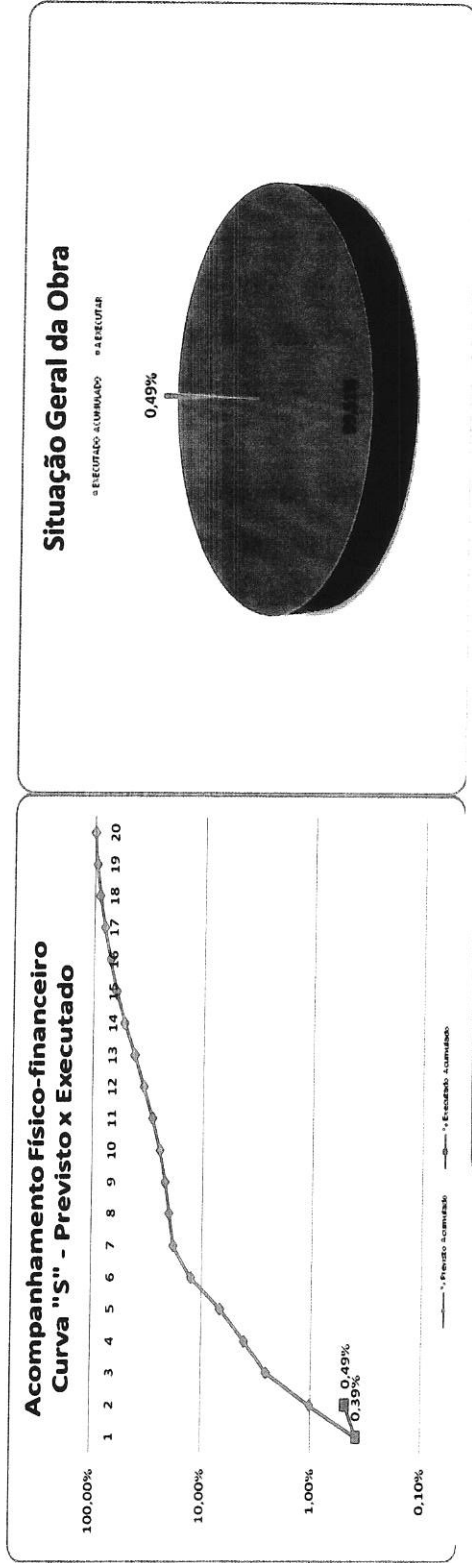
1.6 03 Mar 10: celebrou-se o Plano de Trabalho (PTrab) nº 40.142.11.22.04.02 cujo objeto é Assessoramento Técnico no Gerenciamento e Fiscalização da 3ª etapa da obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região (etapa de estruturas).

1.7 18 Mar 11: a contratada apresentou a proposta de para a 2ª medição do contrato no valor total de R\$ 280.803,48 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e três reais e quarenta e oito centavos).

1.8 21 Mar 11: a CFC nº 098/2010/TRF1 encaminhou o Ofício nº 011/2011 com a proposta de medição da Engefort para análise e parecer a respeito do pleito solicitado pela contratada

1.9 Este relatório refere-se à **2ª medição** do Contrato nº 098/2010/TRF/1 e tem por finalidade a análise dos serviços executados no período entre 11/02 a 28 Fev 2011.

3.3 Acompanhamento gráfico.



4. CONCLUSÃO

Após a compilação da documentação acostada, salvo erro ou omissão, conclui-se que:

4.1 Confrontando a produção financeira realizada neste período (11 Feb 11 a 28 Feb 11) com a prevista no Cronograma Físico-Financeiro da obra (Apêndice 4), percebe-se, em critérios financeiros, que o volume de serviços executados foram inferiores ao previsto, **caracterizando atraso** da execução da obra.

4.2 Em termos monetários, a medição referente a este período totalizou **R\$ 87.861,29 (oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos)**. Em termos percentuais, a medição atingiu o percentual de **0,10%** do valor global da obra, inferior ao previsto para o período, que seria de 0,64%.

4.3 O percentual acumulado da obra ficou em 0,49%, correspondente a um faturamento acumulado até a data atual de **R\$ 438.772,83**. O percentual acumulado previsto para o período seria de 1,03%, ou seja, até o presente período há um aumento de produção da ordem de 52,4% em relação ao cronograma físico-financeiro do contrato.

4.4 Índice de Desempenho de Prazo (IDP). O IDP para o mês foi de 0,47 significando que, em se mantendo esta tendência, o prazo para o término da obra **será de 1.266,66 dias**, ao invés dos 600 dias previstos no Contrato. Maiores detalhes ver Apêndice 5. O atraso verificado até a presente data é de aproximadamente **29,47 dias**.



APÊNDICES e ANEXOS

Apêndice 1: Planilha de medição de serviços.

Apêndice 2: Memória de cálculo da medição.

Apêndice 3: Cronograma Físico-financeiro.


Apêndice 4: Cálculo do IDP mensal.


Anexo 1: Memória das mensagens do grupo a respeito desta medição.

Anexo 2: Memória das mensagens do grupo a respeito desta medição.

Brasília, 15 de abril de 2011.

Pela JBS:



ANTÔNIO OLIVEIRA ROCHA
Topógrafo
JBS Cons., Projetos e Const. Ltda


CARLOS A. BACCINI BARBOSA
Consultor Especial
JBS Cons., Projetos e Const. Ltda



FRANCISCA DALIANE DE AQUINO
Técnica em Edificações
JBS Cons., Projetos e Const. Ltda



FERNANDO VICENTE DA SILVA
Secretário
JBS Cons., Projetos e Const. Ltda


Pela CRO/11:



CLEVERSON DE FREITAS – 2º Ten
Engenheiro Civil
CREA: 75.074/D-PR



RICARDO MEDRADO C. TEIXEIRA – 2º Ten
Engenheiro Mecânico
CREA: 16256/D-DF


RICARDO H. F. CAMPOS- 3º Sgt
Técnico em Edificações
CREA: 9463-D/DF


JOÃO DIAS DOS SANTOS NETO – 3º Sgt
Técnico em Edificações
CREA: 9483/D-DF


EDUARDO DA SILVA SALES – 3º Sgt
Técnico em Edificações


MARCOS LUÍS ALVES DA SILVA - Maj
Engenheiro de Fortificação e Construção
Coor Eqp Asse Tec


MARCELO DE CARVALHO PRATES – Ten Cel
Engenheiro de Fortificação e Construção
Chefe da CRO/11


ROBERTH SANTOS LIMA - Maj
Engenheiro Eletricista
Chefe da Sec Tec

Distribuição:		
CRO/11/Eqp Asse Tec	TRF1	Contratada
02	02	01
