



[illegible]

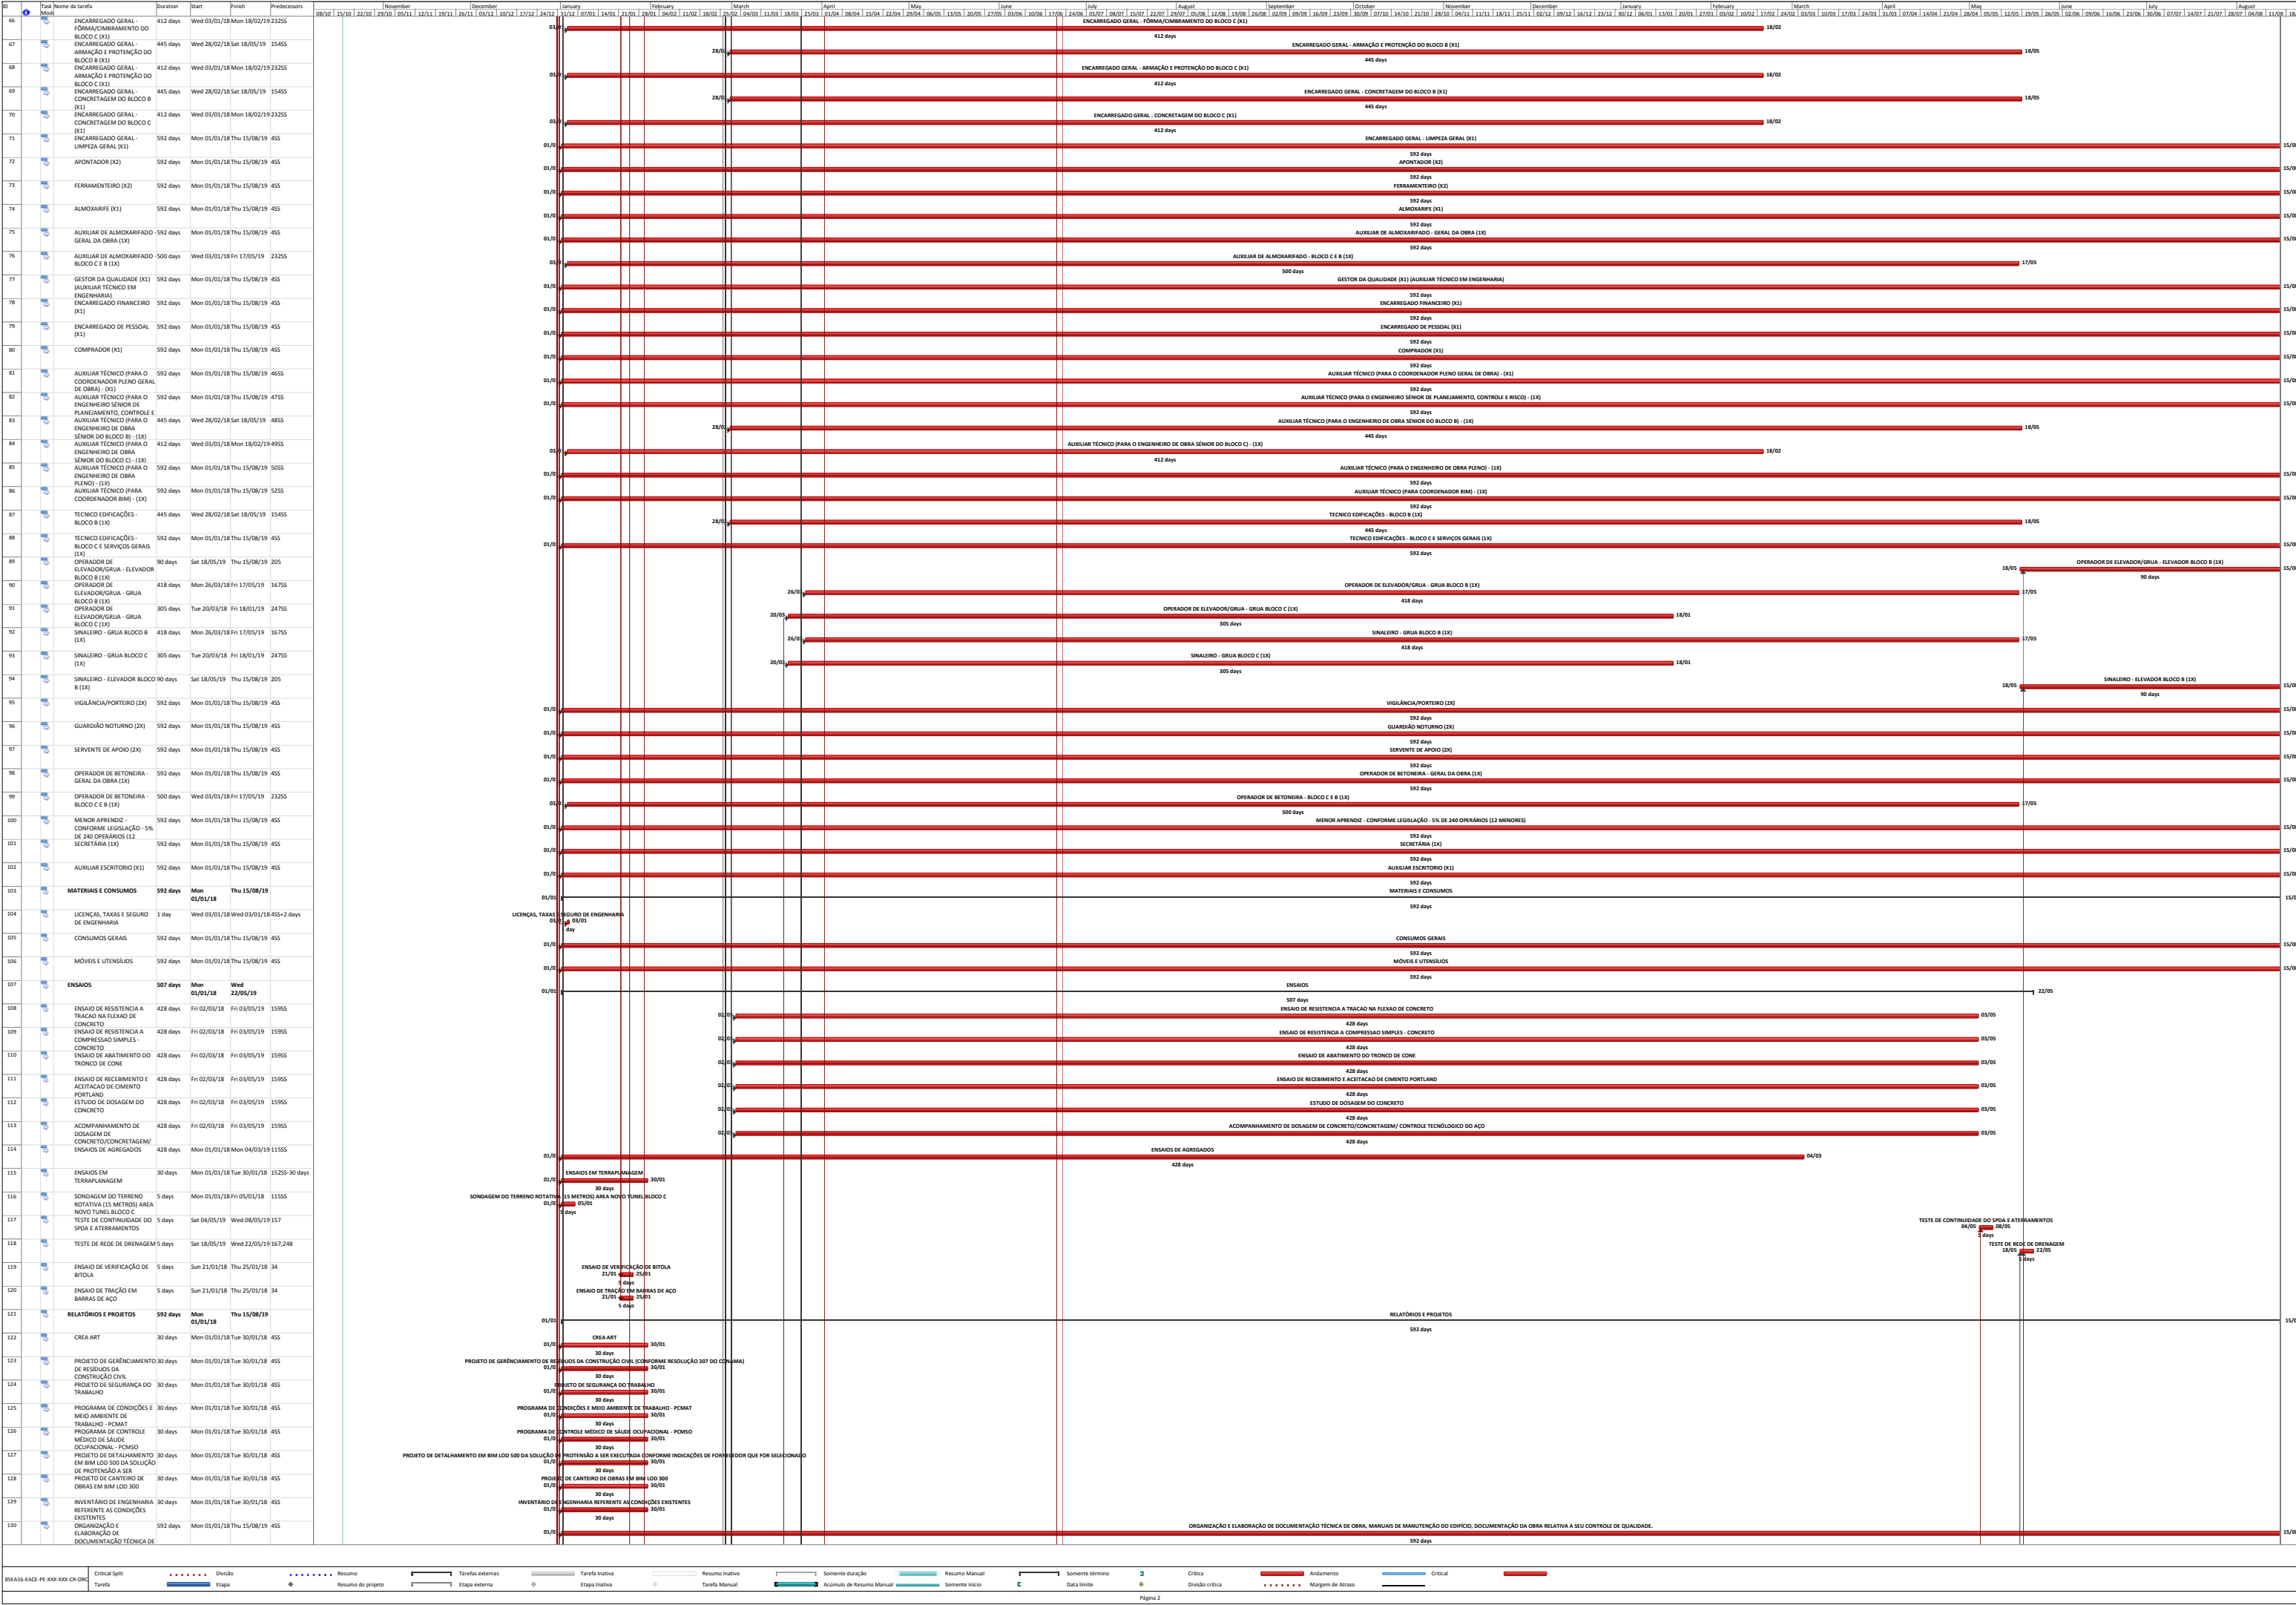

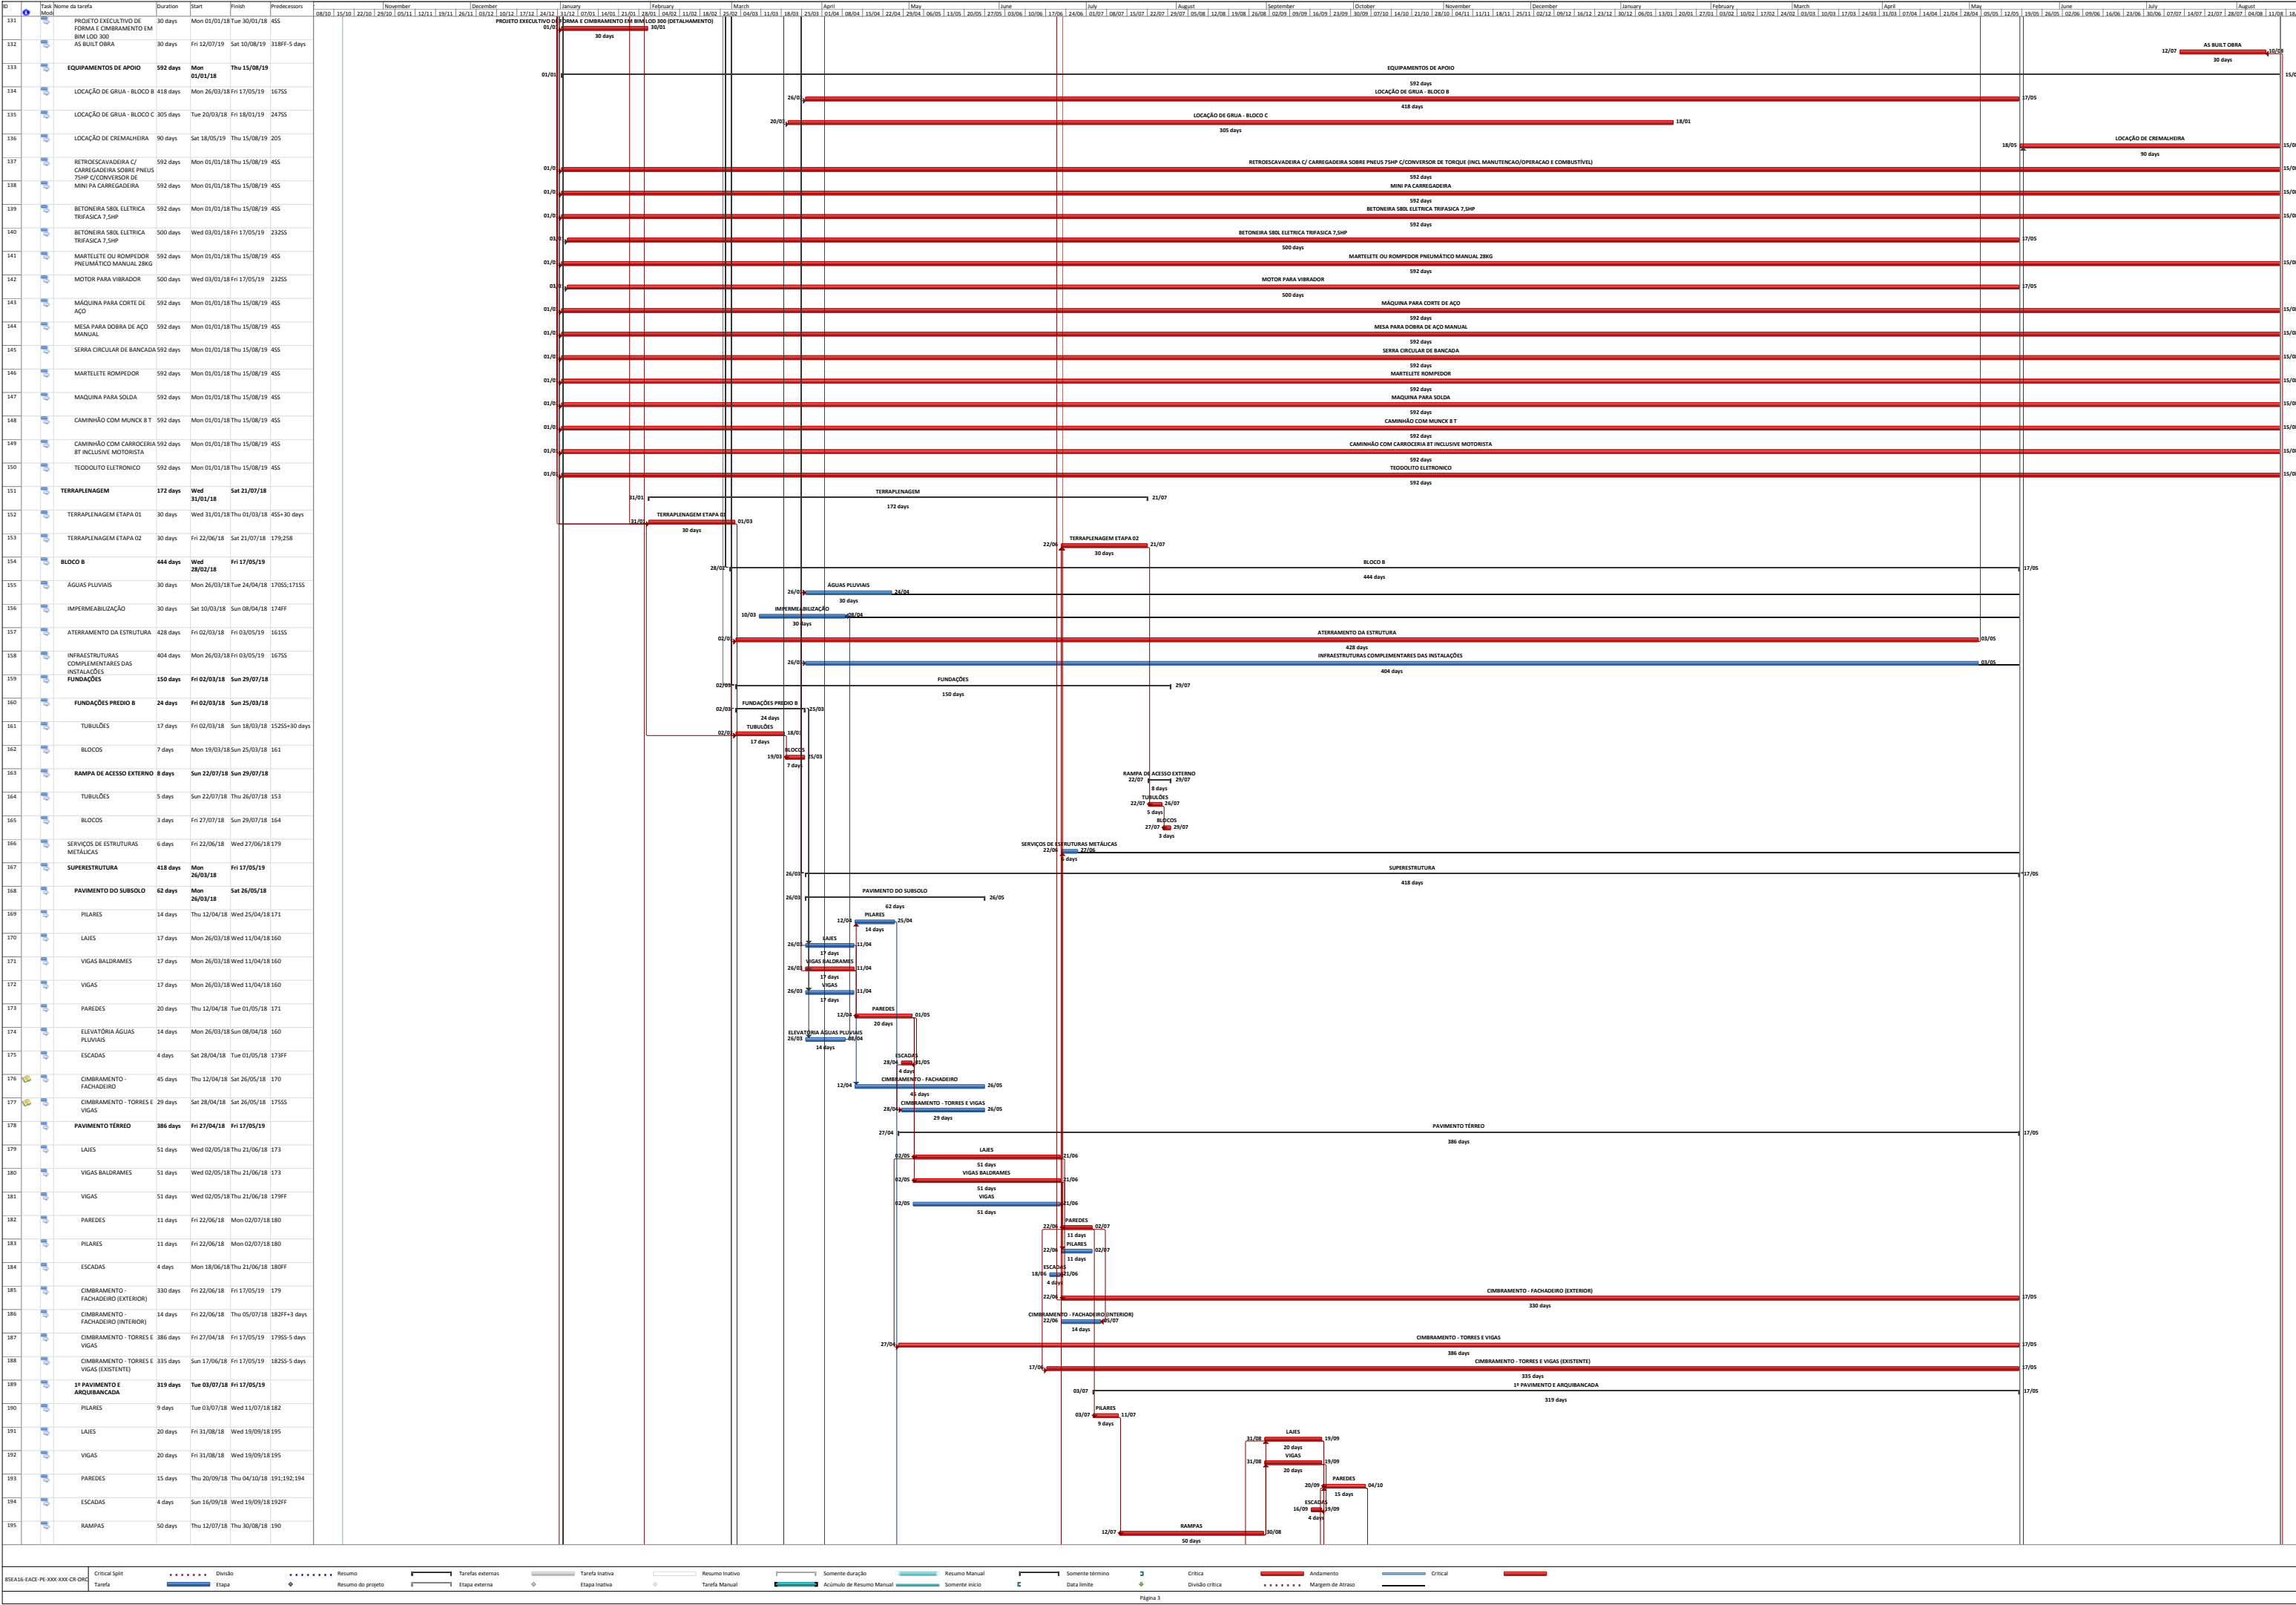

Tarefa	Nome da tarefa	Mostr	Duration	Start	Finish	Predecessors
196	CIMBRAMENTO - FACHADEIRO		240 days	Thu 20/01/18	Fri 17/05/19	191
197	CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS		265 days	Sun 26/08/18	Fri 17/05/19	19155-5 days
198	2º PAVIMENTO E ARQUIBANCADA		230 days	Sun 30/09/18	Fri 17/05/19	
199	PILARES		9 days	Fri 26/10/18	Sat 03/11/18	200
200	LAJES		21 days	Fri 05/10/18	Thu 25/10/18	193
201	VIGAS		21 days	Fri 05/10/18	Thu 25/10/18	193
202	PAREDES		76 days	Fri 26/10/18	Wed 09/01/19	200,201
203	CIMBRAMENTO METÁLICO - FACHADEIROS		204 days	Fri 26/10/18	Fri 17/05/19	200
204	CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS		230 days	Sun 30/09/18	Fri 17/05/19	20055-5 days
205	PISO DE SUSTENTAÇÃO		133 days	Sat 05/01/19	Fri 17/05/19	
206	VIGAS		40 days	Thu 10/01/19	Mon 18/02/19	202
207	PAREDES		30 days	Tue 19/02/19	Wed 20/03/19	206
208	CIMBRAMENTO - FACHADEIRO		93 days	Thu 14/02/19	Fri 17/05/19	20755-5 days
209	CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS		133 days	Sat 05/01/19	Fri 17/05/19	20655-5 days
210	COBERTURA		63 days	Sat 16/03/19	Fri 17/05/19	
211	LAJES		28 days	Thu 21/03/19	Wed 17/04/19	207
212	VIGAS		28 days	Thu 21/03/19	Wed 17/04/19	207
213	PAREDES		16 days	Thu 18/04/19	Fri 03/05/19	211,212
214	CIMBRAMENTO - FACHADEIRO		35 days	Sat 13/04/19	Fri 17/05/19	21355-5 days
215	CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS		63 days	Sat 16/03/19	Fri 17/05/19	21155-5 days
216	RAMPA DE ACESSO EXTERNO		159 days	Sat 22/09/18	Wed 27/02/19	
217	PILARES		16 days	Thu 27/08/18	Fri 12/10/18	19355-7 days
218	LAJES		16 days	Sat 13/10/18	Sun 28/10/18	217
219	VIGAS		16 days	Sat 13/10/18	Sun 28/10/18	217
220	CIMBRAMENTO - FACHADEIRO		143 days	Sat 22/09/18	Mon 11/02/19	21755-5 days
221	CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS		143 days	Mon 08/10/18	Wed 27/02/19	21855-5 days
222	DEMOLUÇÃO E RECONSTRUÇÃO SUBSÓLOS		5 days	Thu 26/04/18	Mon 30/04/18	169
223	INTERVENÇÕES VIGAS		5 days	Fri 02/03/18	Tue 06/03/18	15955
224	CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS - INTERVENÇÕES VIGAS		44 days	Wed 28/02/18	Thu 12/04/18	22355-2 days
225	CIMBRAMENTO METÁLICO - FACHADEIROS - INTERVENÇÕES VIGAS		22 days	Wed 28/02/18	Wed 21/03/18	22355-2 days
226	REFORÇO DE PILARES EXISTENTES VIGAS (PILARES 219 E 220)		39 days	Fri 02/03/18	Mon 09/04/18	
227	DEMOLUÇÃO		2 days	Fri 02/03/18	Sat 03/03/18	16055
228	MOVIMENTO DE TERRAS		2 days	Sun 04/03/18	Mon 05/03/18	227
229	FUNDAÇÃO		7 days	Tue 06/03/18	Mon 12/03/18	228
230	RECOMPOSIÇÃO LAJE SUBSOLO		7 days	Tue 13/03/18	Mon 19/03/18	229
231	REFORÇO PILAR		21 days	Tue 20/03/18	Mon 09/04/18	230
232	BLOCO C		412 days	Wed 03/01/18	Mon 18/02/19	
233	ÁGUAS PLUVIAIS		30 days	Fri 16/03/18	Sat 14/04/18	244
234	IMPERMEABILIZAÇÃO		30 days	Fri 16/03/18	Sat 14/04/18	244
235	INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES DAS INSTALAÇÕES		310 days	Tue 20/03/18	Wed 23/01/19	24755
236	ATERRAMENTO DA ESTRUTURA		328 days	Fri 02/03/18	Wed 23/01/19	24355
237	DEMOLIÇÕES		15 days	Wed 03/01/18	Wed 17/01/18	
238	PAVIMENTO DO SUBSOLO		5 days	Wed 03/01/18	Sun 07/01/18	455-2 days
239	PAVIMENTO DO TERREO		5 days	Wed 03/01/18	Sun 07/01/18	23855
240	1º PAVIMENTO		10 days	Mon 08/01/18	Wed 17/01/18	239
241	FUNDAÇÕES		18 days	Fri 02/03/18	Mon 19/03/18	
242	FUNDAÇÕES PRÉDIO C		18 days	Fri 02/03/18	Mon 19/03/18	
243	TUBULÕES		7 days	Fri 02/03/18	Thu 08/03/18	152
244	BLOCOS		7 days	Fri 09/03/18	Thu 15/03/18	243
245	VIGAS BALDRAMES		4 days	Fri 16/03/18	Mon 19/03/18	244
246	SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS		3 days	Sat 16/02/19	Mon 18/02/19	256
247	SUPERESTRUTURA		333 days	Tue 20/03/18	Fri 15/02/19	
248	PAVIMENTO DO SUBSOLO		33 days	Tue 20/03/18	Sat 21/04/18	
249	LAJES/VIGAS		16 days	Tue 20/03/18	Wed 04/04/18	242
250	ESCADAS		4 days	Thu 05/04/18	Sun 08/04/18	249
251	ELEVATÓRIA ÁGUAS PLUVIAIS		6 days	Fri 30/03/18	Wed 04/04/18	249FF
252	PILARES		7 days	Thu 05/04/18	Wed 11/04/18	249
253	PAREDES		14 days	Thu 05/04/18	Wed 18/04/18	249
254	CIMBRAMENTO - FACHADEIRO		17 days	Thu 05/04/18	Sat 21/04/18	249
255	CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS		8 days	Tue 03/04/18	Tue 10/04/18	25055-2 days
256	PISO TERREO		305 days	Tue 17/04/18	Fri 15/02/19	
257	PILARES		7 days	Sat 12/05/18	Fri 18/05/18	258
258	LAJES		20 days	Sun 22/04/18	Fri 11/05/18	248
259	VIGAS		20 days	Sun 22/04/18	Fri 11/05/18	248
260	ESCADAS		2 days	Thu 10/05/18	Fri 11/05/18	258FF

RSEAIIS-EACI-PE-XXX-XXX-CH-ORD

Critical Split ● ● ● ● ● ● Divido ● ● ● ● ● ● Resumo Tarefa externa Tarefa inativa Resumo inativo Somente duração Resumo Manual Somente término 3 Crítica Andamento Critical

Tarefa Etapa ◆ Resumo do projeto Etapa externa ◆ Etapa inativa ◆ Tarefa Manual Acúmulo de Resumo Manual Somente início E Data limite ◆ Divisão crítica ● ● ● ● ● ● Margem de Atraso

Página 5



Eng.º Guilherme Machado
(Coordenador de Projeto)



Eng.º Luís Oliveira
(Aprovação)



Eng.º Claudia
Silveira
(Elaboração)
