





Id		% concluída	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
1		56%	Projeto Processo Eletrônico	110,13 dias?	Qui 30/7/09	Sex 8/1/10	
2		76%	Fase de iniciação	53 dias?	Qui 30/7/09	Qua 14/10/09	
3	✓	100%	Reunião de solicitação de serviço	8 hrs	Qui 30/7/09	Qui 30/7/09	
4	✓	100%	Levantamento de requisitos inicial	12,5 dias	Sex 31/7/09	Ter 18/8/09	
8	✓	100%	Reunião de inicio	2 hrs	Qui 20/8/09	Qui 20/8/09	
9	✓	100%	Preparação do ambiente	1 hr	Qui 20/8/09	Qui 20/8/09	
10	✓	100%	Elaboração de solicitação de serviço	16 hrs	Sex 21/8/09	Seg 24/8/09	
11	✓	100%	Elaborar Cronograma	2,88 dias	Ter 25/8/09	Qui 27/8/09	
12	✓	100%	Elaboração do cronograma	16 hrs	Ter 25/8/09	Qua 26/8/09	10
13	✓	100%	Homologação do cronograma	3 hrs	Qui 27/8/09	Qui 27/8/09	12
14	✓	100%	Ajustes do cronograma	4 hrs	Qui 27/8/09	Qui 27/8/09	13
15	✓	100%	Elaborar Planos	22 dias	Qui 27/8/09	Seg 28/9/09	
16	✓	100%	Plano de gerencia de requisitos	4 hrs	Qui 27/8/09	Sex 28/8/09	14
17	✓	100%	Plano de gerenciamento de riscos	4 hrs	Sex 28/8/09	Sex 28/8/09	16
18	✓	100%	Plano de comunicação	8 hrs	Seg 28/9/09	Seg 28/9/09	
19	✓	100%	Documento de visão	7,18 dias	Seg 24/8/09	Qua 2/9/09	
23	✓	100%	Plano de testes	137,4 hrs	Qua 2/9/09	Seg 28/9/09	22
24		24%	Plano arquitetural	136 hrs	Qua 2/9/09	Seg 28/9/09	22
25		78%	Diagrama de caso de uso de sistema	28,83 dias?	Qua 2/9/09	Qua 14/10/09	
26	✓	100%	Elaboração do diagrama	6 hrs?	Qua 2/9/09	Qua 2/9/09	22
27	✓	100%	Homologação do diagrama	4 hrs?	Qua 2/9/09	Qui 3/9/09	26
28	✓	100%	Ajuste no diagrama	4 hrs?	Qui 3/9/09	Qui 3/9/09	27
29		76%	Elaboração	28,83 dias?	Qua 2/9/09	Qua 14/10/09	
30	✓	100%	Elaboração de wireframe	10 dias?	Qua 2/9/09	Qui 17/9/09	22
31	✓	100%	Definição do modelo de dados inicial	16 hrs	Qui 17/9/09	Seg 21/9/09	30
32	☒	30%	Elaboração do modelo de dados físico	3 dias?	Sex 2/10/09	Ter 6/10/09	31
33	☒	10%	Preparação de ambiente de desenvolvimento	40 hrs	Qua 7/10/09	Qua 14/10/09	32
34	✓	100%	Evento de Mapeamento de localizações e tarefas	2 dias?	Qui 8/10/09	Sex 9/10/09	
35	✓	100%	Definição do conteúdo da tabela de documentos	6 dias?	Sex 2/10/09	Sex 9/10/09	
36		64%	1ª interação	59,95 dias	Qui 17/9/09	Seg 14/12/09	

Projeto: TRF-RED_eSentinela-Crr
Data: Sex 27/11/09

Tarefa 
Divisão 
Andamento 

Etapa 
Resumo 
Resumo do projeto 

Tarefas externas 
Etapa Tarefa 
Divisão 

Id		% concluída	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
37		71%	Caso de uso - Manter aviso	51,08 dias	Qui 17/9/09	Ter 1/12/09	
38		100%	Levantamento e especificação	54,6 hrs	Qui 17/9/09	Sex 25/9/09	30
39	 	100%	Revisão	16 hrs	Seg 28/9/09	Ter 29/9/09	38
40		100%	Homologação	1 hr	Qua 30/9/09	Qua 30/9/09	39
41		100%	Repasse para projeto	4 hrs	Qua 30/9/09	Qua 30/9/09	40
42		100%	Realização do caso de uso	12 hrs	Sex 16/10/09	Seg 19/10/09	41
43		100%	Alteração em banco de dados	16 hrs	Seg 19/10/09	Qua 21/10/09	42;31
44	 	100%	Desenvolvimento	80 hrs	Ter 6/10/09	Qua 4/11/09	43;42
45		100%	Repasse para teste	1 hr	Qui 12/11/09	Qui 12/11/09	44
46		100%	Teste	24 hrs	Qui 12/11/09	Seg 16/11/09	45
47		3%	Correção	88 hrs	Seg 16/11/09	Seg 30/11/09	46II+1 dia
48		0%	Reteste	2 hrs	Ter 1/12/09	Ter 1/12/09	47
49		71%	Caso de uso - Manter permissão de localização	51,08 dias	Qui 17/9/09	Ter 1/12/09	
50		100%	Levantamento e especificação	64 hrs	Qui 17/9/09	Ter 29/9/09	30
51		100%	Revisão	4 hrs	Ter 29/9/09	Ter 29/9/09	50
52		100%	Homologação	1 hr	Ter 29/9/09	Ter 29/9/09	51
53		100%	Repasse para projeto	2 hrs	Ter 29/9/09	Qua 30/9/09	52
54		100%	Realização do caso de uso	30 hrs	Qua 30/9/09	Seg 5/10/09	53
55		100%	Alteração em banco de dados	16 hrs	Seg 5/10/09	Qua 7/10/09	54
56		100%	Desenvolvimento	145,6 hrs	Qua 7/10/09	Qua 4/11/09	55
57		100%	Repasse para teste	1 hr	Qui 5/11/09	Qui 5/11/09	56
58		100%	Teste	24 hrs	Qui 5/11/09	Ter 10/11/09	57
59		9%	Correção	135 hrs	Sex 6/11/09	Seg 30/11/09	58II+1 dia
60		0%	Reteste	2 hrs	Ter 1/12/09	Ter 1/12/09	59
61		67%	Caso de uso - Efetuar Login	42,25 dias	Qua 30/9/09	Ter 1/12/09	
62		100%	Levantamento e especificação	40 hrs	Qua 30/9/09	Sex 9/10/09	30
63		100%	Revisão	8 hrs	Sex 16/10/09	Sex 16/10/09	
64		100%	Homologação	1 hr	Seg 19/10/09	Seg 19/10/09	63
65		100%	Repasse para projeto	2 hrs	Seg 19/10/09	Seg 19/10/09	64
66		100%	Realização do caso de uso	20 hrs	Seg 19/10/09	Qua 21/10/09	65;41

Projeto: TRF-RED_eSentinela-Crr
Data: Sex 27/11/09

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto




Tarefas externas



Etapa Tarefa

Divisão

Id		% concluída	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
67	✓	100%	Alteração em banco de dados	16 hrs	Qua 21/10/09	Sex 23/10/09	66
68	✓	100%	Desenvolvimento	80 hrs	Sex 23/10/09	Seg 9/11/09	66;67
69	✓	100%	Repasse para teste	1 hr	Seg 9/11/09	Seg 9/11/09	68
70	✓	100%	Teste	24 hrs	Ter 10/11/09	Qui 12/11/09	69
71	📅	11%	Correção	112 hrs	Qua 11/11/09	Seg 30/11/09	70II+1 dia
72		0%	Reteste	2 hrs	Ter 1/12/09	Ter 1/12/09	71
73		63%	Caso de uso - Manter tarefa	30,25 dias	Seg 19/10/09	Ter 1/12/09	
74	✓	100%	Levantamento e especificação	24 hrs	Seg 19/10/09	Qua 21/10/09	40
75	✓	100%	Revisão	4 hrs	Qui 22/10/09	Qui 22/10/09	74
76	✓	100%	Homologação	1 hr	Qui 22/10/09	Qui 22/10/09	75
77	✓	100%	Repasse para projeto	1 hr	Ter 3/11/09	Ter 3/11/09	76
78	✓	100%	Realização do caso de uso	32 hrs	Ter 3/11/09	Seg 9/11/09	77
79	✓	100%	Alteração em banco de dados	16 hrs	Seg 9/11/09	Qua 11/11/09	78
80	✓	100%	Desenvolvimento	15 hrs	Qua 11/11/09	Qui 12/11/09	79
81	✓	100%	Repasse para teste	1 hr	Qui 12/11/09	Qui 12/11/09	80
82	📅	85%	Teste	39 hrs	Qui 12/11/09	Qua 18/11/09	81
83	📅	4%	Correção	72 hrs	Qua 18/11/09	Seg 30/11/09	82II+1 dia
84		0%	Reteste	2 hrs	Ter 1/12/09	Ter 1/12/09	83
85	📅	0%	Elaboração de Manual	80 hrs	Seg 30/11/09	Sex 11/12/09	77
86		0%	Disponibilização para homologação	1 hr	Seg 14/12/09	Seg 14/12/09	85;72;48;84;60
87		62%	2ª interação	72,83 dias	Qui 17/9/09	Ter 5/1/10	
88		80%	Caso de uso - Gerenciar Processos	51,08 dias	Qui 17/9/09	Ter 1/12/09	
89	✓	100%	Levantamento e especificação	90 hrs	Qui 17/9/09	Sex 2/10/09	30
90	✓	100%	Revisão	16 hrs	Sex 2/10/09	Ter 6/10/09	89
91	✓	100%	Homologação	2 hrs	Ter 6/10/09	Ter 6/10/09	90
92	✓	100%	Repasse para projeto	3 hrs	Ter 6/10/09	Qua 7/10/09	91
93	✓	100%	Realização do caso de uso	76 hrs	Qua 7/10/09	Qua 21/10/09	92;54
94	✓	100%	Alteração em banco de dados	16 hrs	Qua 14/10/09	Sex 23/10/09	93
95	📅	90%	Desenvolvimento	166,8 hrs	Sex 16/10/09	Sex 20/11/09	94
96		0%	Repasse para teste	2 hrs	Seg 23/11/09	Seg 23/11/09	95

Projeto: TRF-RED_eSentinela-Crr
Data: Sex 27/11/09




Tarefa 
Divisão 
Andamento 




Etapa 
Resumo 
Resumo do projeto 


Tarefas externas 
Etapa Tarefa 
Divisão 

Id		% concluída	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
97		0%	Teste	40 hrs	Seg 23/11/09	Seg 30/11/09	96
98		0%	Correção	24 hrs	Qua 25/11/09	Seg 30/11/09	97II+2 dias
99		0%	Reteste	8 hrs	Seg 30/11/09	Ter 1/12/09	98
100		58%	Caso de uso - Gerenciar documentos	70,7 dias	Seg 21/9/09	Ter 5/1/10	
101	✓	100%	Levantamento e especificação	302,6 hrs	Seg 21/9/09	Sex 13/11/09	31
102	✓	100%	Revisão	8 hrs	Sáb 14/11/09	Seg 16/11/09	101
103	✓	100%	Homologação	2 hrs	Dom 15/11/09	Seg 16/11/09	102
104	☐	0%	Repasse para projeto	3 hrs	Seg 16/11/09	Seg 16/11/09	103
105		50%	Realização do caso de uso	36 hrs	Seg 16/11/09	Seg 23/11/09	104;78
106		50%	Alteração em banco de dados	16 hrs	Seg 23/11/09	Qua 25/11/09	105
107		5%	Desenvolvimento	160 hrs	Qua 25/11/09	Qua 23/12/09	106
108		0%	Repasse para teste	2 hrs	Qua 23/12/09	Qua 23/12/09	107
109		0%	Teste	40 hrs	Qua 23/12/09	Seg 4/1/10	108
110		0%	Correção	20 hrs	Ter 29/12/09	Seg 4/1/10	109II+2 dias
111		0%	Reteste	8 hrs	Seg 4/1/10	Ter 5/1/10	110
112		0%	Elaboração de Manual	80 hrs	Seg 14/12/09	Ter 29/12/09	85
113		0%	Disponibilização para homologação	1 hr	Ter 5/1/10	Ter 5/1/10	112;111;99
114		24%	3ª Interação	45,13 dias	Ter 3/11/09	Sex 8/1/10	
115		15%	Caso de uso - Configurar área de trabalho	45 dias	Ter 3/11/09	Sex 8/1/10	
116	✓	100%	Levantamento e especificação	40 hrs	Ter 3/11/09	Seg 9/11/09	
117	✓	100%	Revisão	8 hrs	Ter 10/11/09	Ter 10/11/09	116
118	✓	100%	Homologação	1 hr	Seg 16/11/09	Seg 16/11/09	
119		0%	Repasse para projeto	3 hrs	Seg 16/11/09	Seg 16/11/09	118
120	☐	0%	Realização do caso de uso	36 hrs	Sex 20/11/09	Qui 26/11/09	119;93
121		0%	Alteração em banco de dados	16 hrs	Qui 26/11/09	Seg 30/11/09	120
122		0%	Desenvolvimento	160 hrs	Seg 30/11/09	Qua 30/12/09	121
123		0%	Repasse para teste	2 hrs	Qua 30/12/09	Qua 30/12/09	122
124		0%	Teste	40 hrs	Qua 30/12/09	Qui 7/1/10	123
125		0%	Correção	24 hrs	Ter 5/1/10	Qui 7/1/10	124II+2 dias
126		0%	Reteste	2 hrs	Sex 8/1/10	Sex 8/1/10	125

Projeto: TRF-RED_eSentinela-Crr
Data: Sex 27/11/09




Tarefa 
Divisão 
Andamento 




Etapa 
Resumo 
Resumo do projeto 

Tarefas externas 
Etapa Tarefa 
Divisão 

Id		% concluída	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
127		43%	Caso de uso - Exibir histórico de processo	29,13 dias	Ter 3/11/09	Seg 14/12/09	
128		100%	Levantamento e especificação	40 hrs	Ter 3/11/09	Seg 9/11/09	
129		100%	Revisão	8 hrs	Ter 10/11/09	Ter 10/11/09	128
130		100%	Homologação	1 hr	Seg 16/11/09	Seg 16/11/09	129
131		100%	Repasse para projeto	2 hrs	Seg 16/11/09	Seg 16/11/09	130
132		100%	Realização do caso de uso	24 hrs	Seg 16/11/09	Qui 19/11/09	131
133		100%	Alteração em banco de dados	16 hrs	Qui 19/11/09	Seg 23/11/09	132
134		15%	Desenvolvimento	96 hrs	Qui 19/11/09	Seg 7/12/09	132
135		0%	Repasse para teste	2 hrs	Seg 7/12/09	Seg 7/12/09	134
136		0%	Teste	36 hrs	Seg 7/12/09	Seg 14/12/09	135
137		0%	Correção	16 hrs	Qua 9/12/09	Sex 11/12/09	136II+2 dias
138		0%	Reteste	2 hrs	Sex 11/12/09	Sex 11/12/09	137
139		20%	Caso de uso - Anexar Documentos	34 dias	Ter 3/11/09	Sex 18/12/09	
140		100%	Levantamento e especificação	40 hrs	Ter 3/11/09	Seg 9/11/09	
141		100%	Revisão	8 hrs	Ter 10/11/09	Ter 10/11/09	140
142		100%	Homologação	1 hr	Seg 16/11/09	Seg 16/11/09	141
143		0%	Repasse para projeto	2 hrs	Seg 23/11/09	Seg 23/11/09	142
144		0%	Realização do caso de uso	24 hrs	Seg 23/11/09	Qui 26/11/09	143
145		0%	Alteração em banco de dados	16 hrs	Qui 26/11/09	Seg 30/11/09	144
146		0%	Desenvolvimento	96 hrs	Qui 26/11/09	Seg 14/12/09	144
147		0%	Repasse para teste	2 hrs	Seg 14/12/09	Seg 14/12/09	146
148		0%	Teste	36 hrs	Seg 14/12/09	Sex 18/12/09	147
149		0%	Correção	16 hrs	Qua 16/12/09	Sex 18/12/09	148II+2 dias
150		0%	Reteste	2 hrs	Sex 18/12/09	Sex 18/12/09	149
151		0%	Elaboração de Manual	36 hrs	Sex 18/12/09	Seg 28/12/09	150
152		0%	Disponibilização para homologação	1 hr	Sex 8/1/10	Sex 8/1/10	138;126
153		5%	Fase de Transição	73,83 dias	Seg 21/9/09	Sex 8/1/10	
154		70%	Plano de implantação	8 hrs	Seg 21/9/09	Ter 22/9/09	31
155		0%	Revisão de Manual	19 hrs	Qua 30/12/09	Seg 4/1/10	
156		0%	Treinamento para DIATU	32 hrs	Seg 4/1/10	Qui 7/1/10	

Projeto: TRF-RED_eSentinela-Crr
Data: Sex 27/11/09




Tarefa 
Divisão 
Andamento 




Etapa 
Resumo 
Resumo do projeto 

Tarefas externas 
Etapa Tarefa 
Divisão 

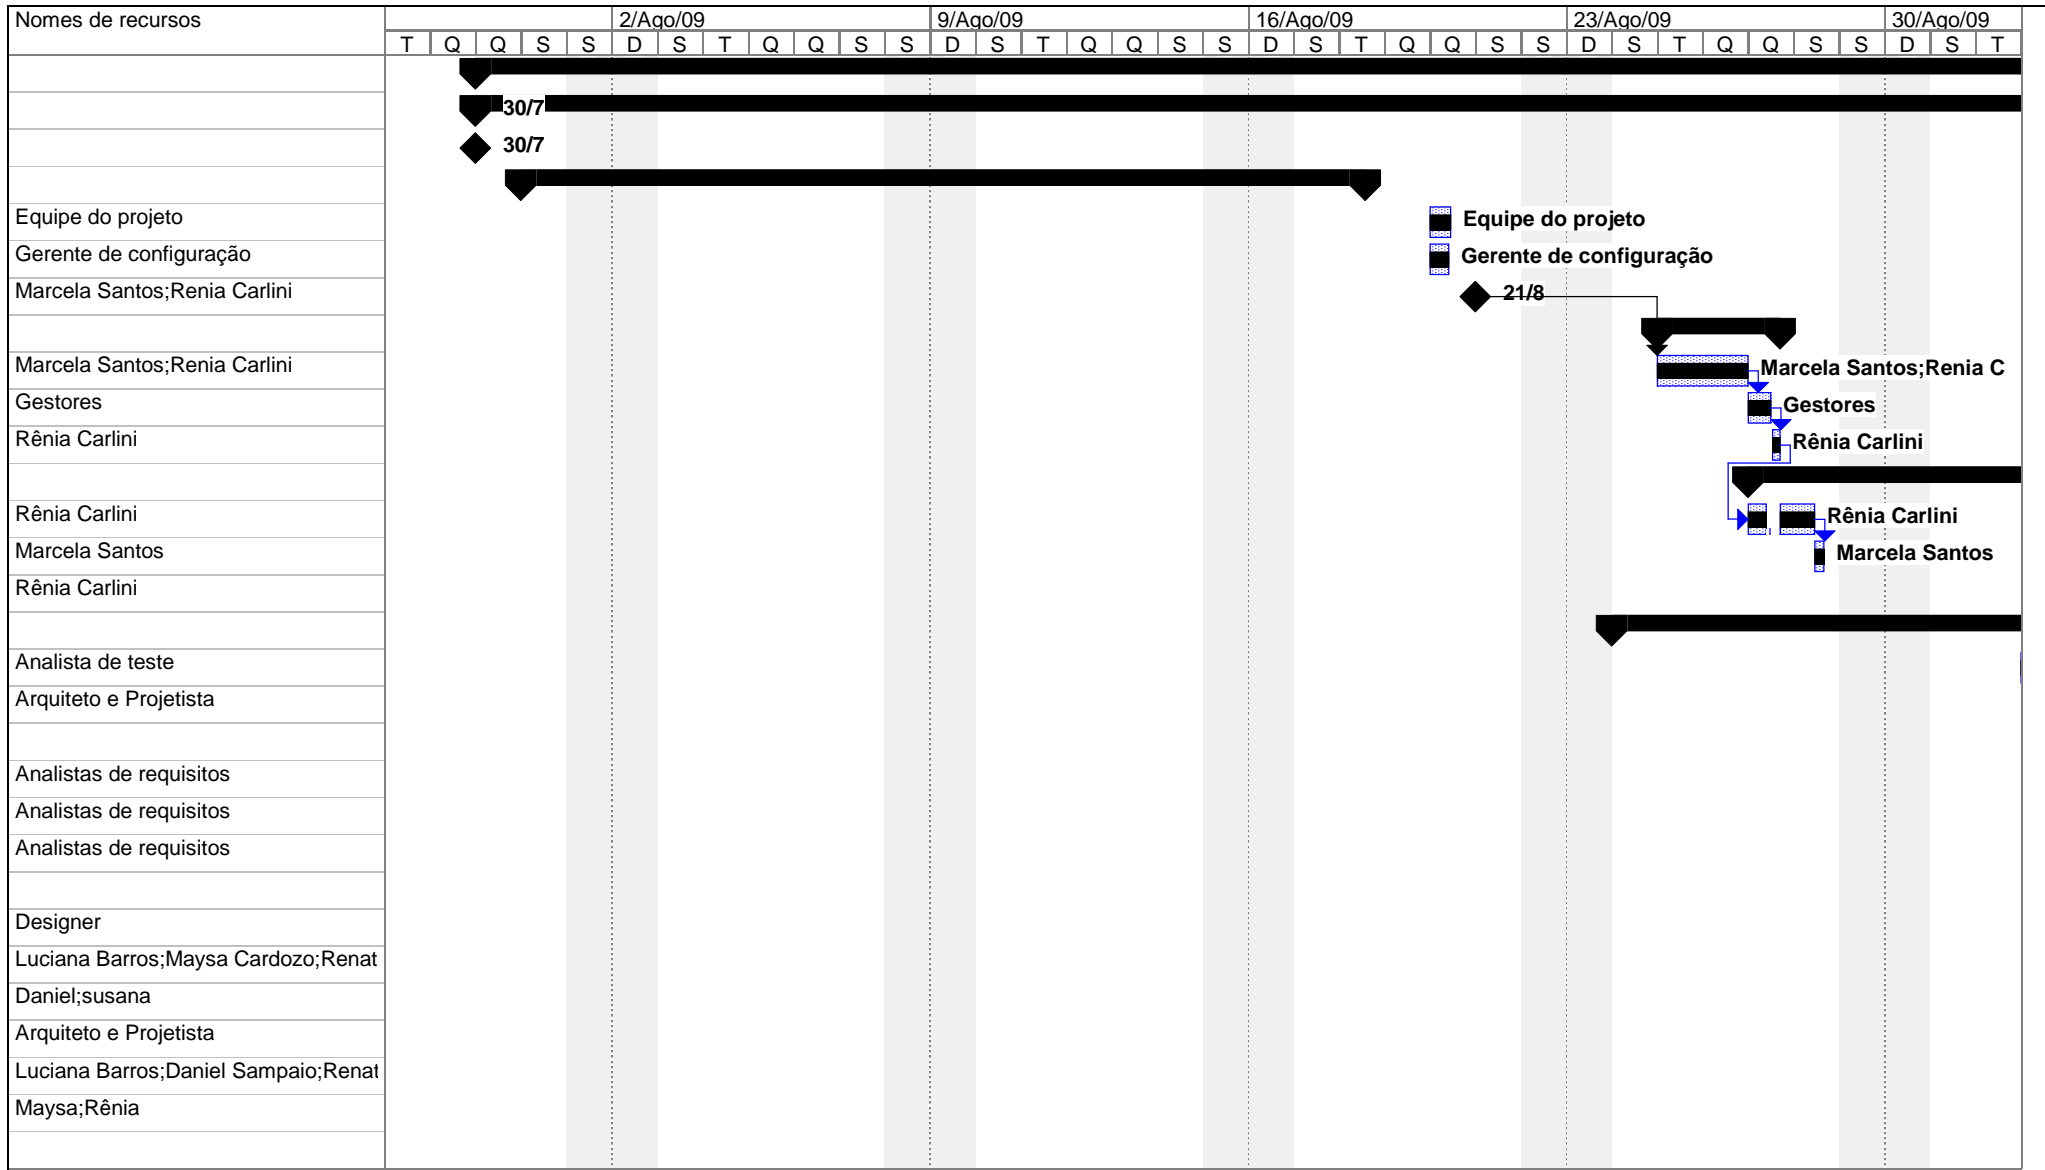
Id		% concluída	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
157		0%	Homologação do projeto	24 hrs	Seg 4/1/10	Qua 6/1/10	
158		0%	Implantação em produção	4,25 dias	Seg 4/1/10	Sex 8/1/10	
159		0%	Preparar ambiente de produção	32 hrs	Seg 4/1/10	Qui 7/1/10	
160		0%	Deploy para produção	2 hrs	Sex 8/1/10	Sex 8/1/10	159
161		84%	Reunião de ponto de controle	92,25 dias	Ter 4/8/09	Ter 15/12/09	
162		100%	Reunião de ponto de controle 1	2 hrs	Ter 4/8/09	Ter 4/8/09	
163		100%	Reunião de ponto de controle 2	2 hrs	Ter 11/8/09	Ter 11/8/09	
164		100%	Reunião de ponto de controle 3	2 hrs	Ter 18/8/09	Ter 18/8/09	
165		100%	Reunião de ponto de controle 4	2 hrs	Ter 25/8/09	Ter 25/8/09	
166		100%	Reunião de ponto de controle 5	2 hrs	Ter 1/9/09	Ter 1/9/09	
167		100%	Reunião de ponto de controle 6	2 hrs	Ter 15/9/09	Ter 15/9/09	
168		100%	Reunião de ponto de controle 7	2 hrs	Ter 22/9/09	Ter 22/9/09	
169		100%	Reunião de ponto de controle 8	2 hrs	Ter 29/9/09	Ter 29/9/09	
170		100%	Reunião de ponto de controle 9	2 hrs	Ter 6/10/09	Ter 6/10/09	
171		100%	Reunião de ponto de controle 10	2 hrs	Ter 13/10/09	Ter 13/10/09	
172		100%	Reunião de ponto de controle 11	2 hrs	Ter 20/10/09	Ter 20/10/09	
173		100%	Reunião de ponto de controle 12	2 hrs	Ter 27/10/09	Ter 27/10/09	
174		100%	Reunião de ponto de controle 13	2 hrs	Ter 3/11/09	Ter 3/11/09	
175		100%	Reunião de ponto de controle 14	2 hrs	Ter 10/11/09	Ter 10/11/09	
176		100%	Reunião de ponto de controle 15	2 hrs	Ter 17/11/09	Ter 17/11/09	
177		100%	Reunião de ponto de controle 16	2 hrs	Ter 24/11/09	Ter 24/11/09	
178		0%	Reunião de ponto de controle 17	2 hrs	Ter 1/12/09	Ter 1/12/09	
179		0%	Reunião de ponto de controle 18	2 hrs	Ter 8/12/09	Ter 8/12/09	
180		0%	Reunião de ponto de controle 19	2 hrs	Ter 15/12/09	Ter 15/12/09	

Projeto: TRF-RED_eSentinela-Crr
Data: Sex 27/11/09

Tarefa 
Divisão 
Andamento 

Etapa 
Resumo 
Resumo do projeto 

Tarefas externas 
Etapa Tarefa 
Divisão 



Projeto: TRF-RED_eSentinela-Crr
 Data: Sex 27/11/09

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa Tarefa	
Andamento		Resumo do projeto		Divisão	
